26.06.2017

Fieseler, Helmut

710539 - L 872 Küstelberg - Deifeld

Bauzeitenplan

Straßen NRW

abgestimmt:
R. Köster 05.07.2017
Straßen NRW
RNL Sauerland-Hochstift

WACHENFELD
VERKEHRSWEGEBAU · TIEFBAU
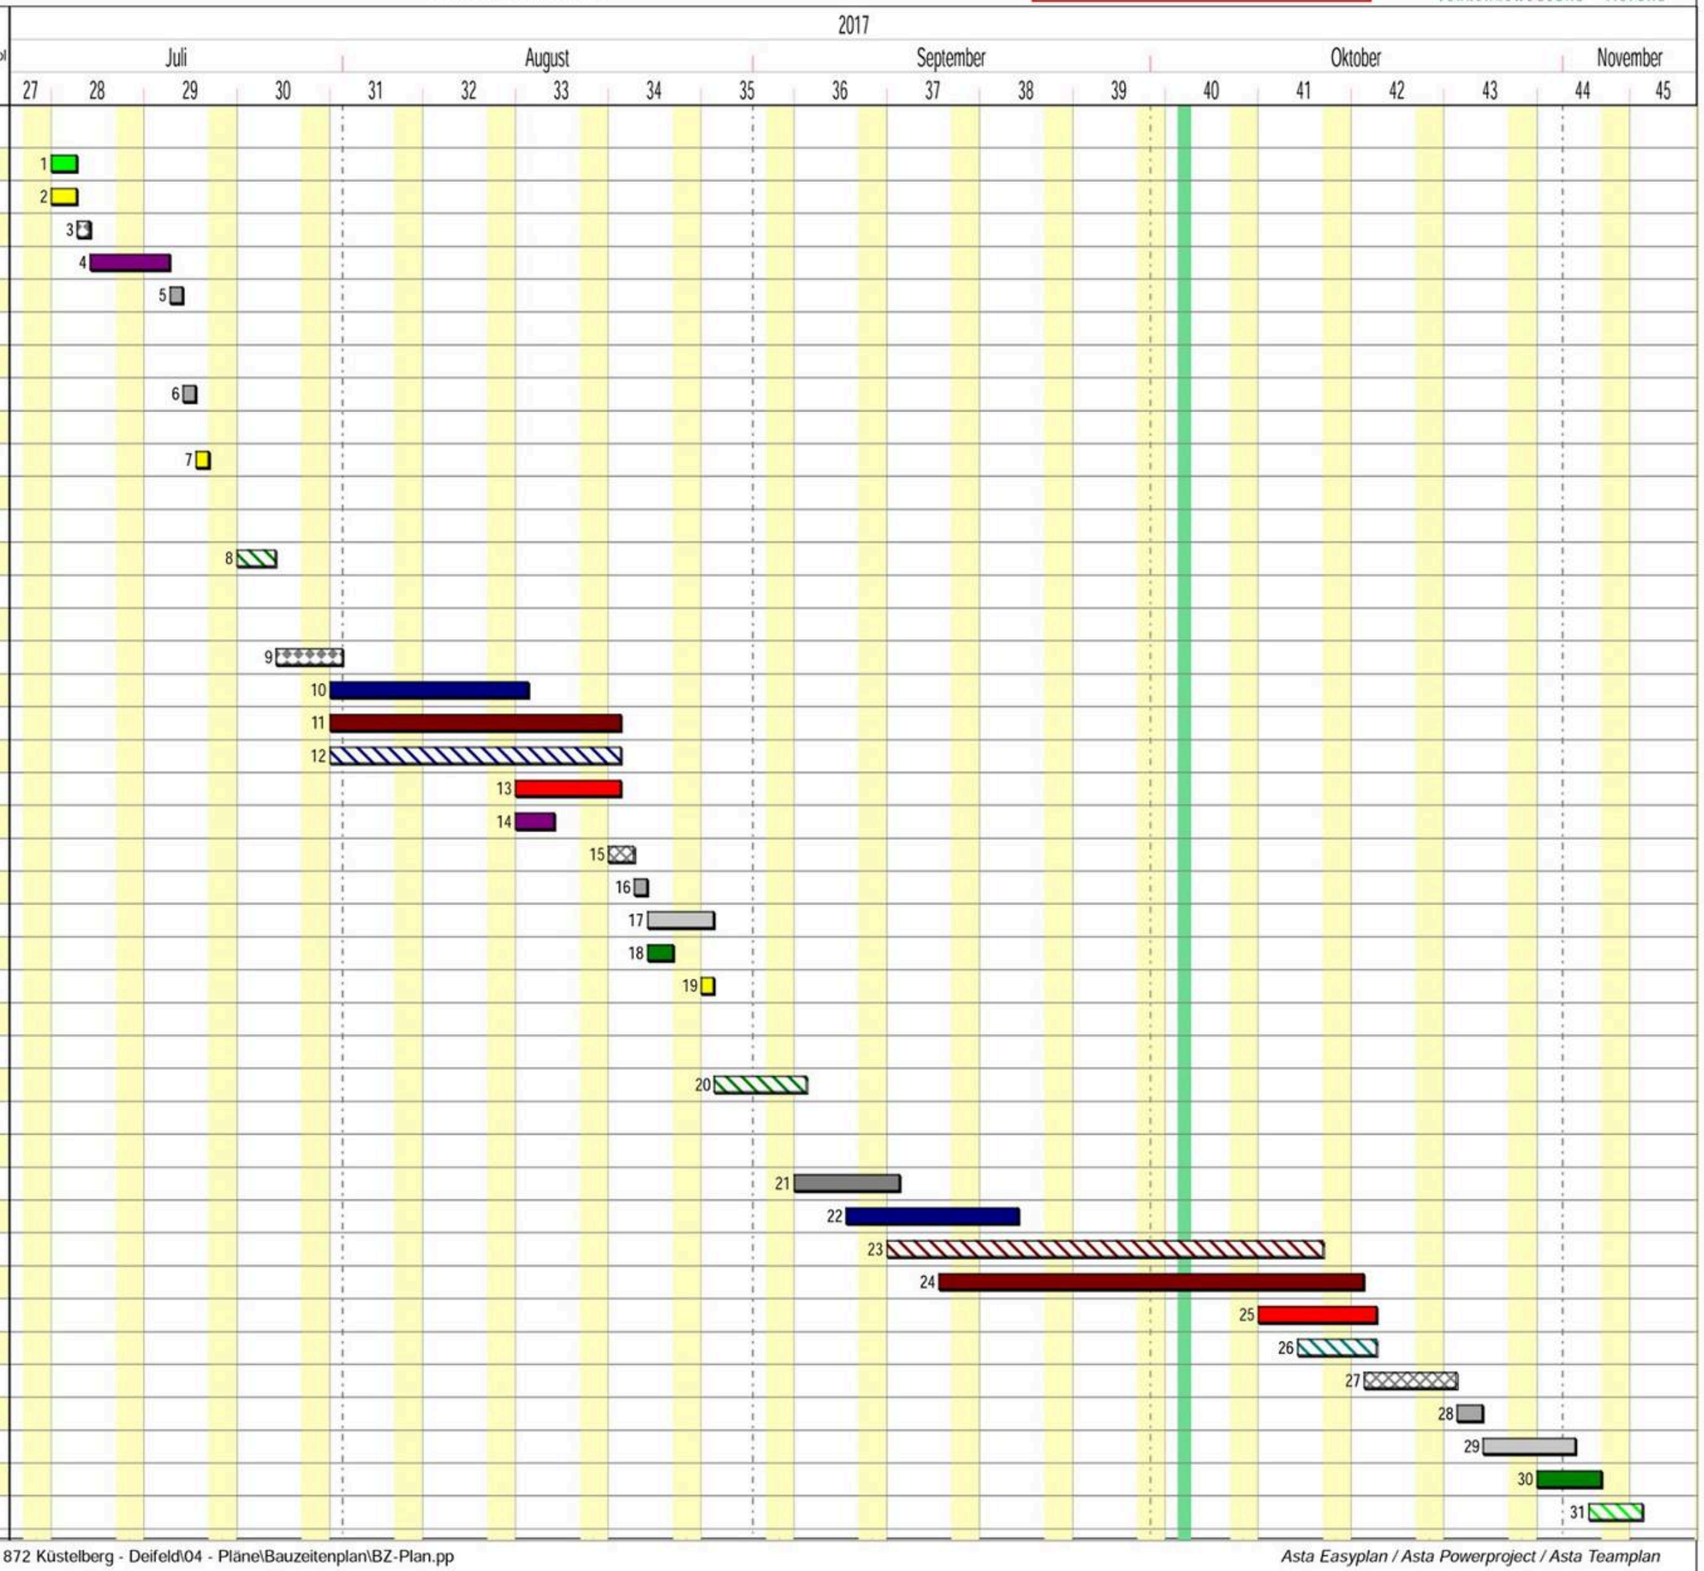
Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende	SIGEcontrol
	BA 1 - OD Wissinghausen 10.07.-21.07.17				
1	Baustelle einrichten	10.07.2017	2t	11.07.2017	
2	Aufbau Verkehrssicherung	10.07.2017	2t	11.07.2017	
3	Asphaltfräsarbeiten OD gesamt	12.07.2017	1t	12.07.2017	
4	Sanierung Rinnenanlagen und Bushaltestelle	13.07.2017	4t	18.07.2017	
5	Asphalteinbau Deckschicht	19.07.2017	1t	19.07.2017	
	. 1. Abschnitt bis Zufahrt Stat.3.150 bis 3.250				
	. + Bushaltestelle				
6	Asphalteinbau Deckschicht	20.07.2017	1t	20.07.2017	
	. 2. Abschnitt Stat.2.920 bis 3.150				
7	Umbau Verkehrssicherung BA 1 zu BA 2	21.07.2017	1t	21.07.2017	
	BA 2 - Wissinghausen -> Deifeld 24.07.-28.08.17				
8	Baufeldberäumung Grassmaat, Schutzplanken,	24.07.2017	3t	26.07.2017	
	Leuchtpfosten, Beschilderung, Rodungsarbeiten,				
	Herstellung Baumschutz				
9	Asphaltfräsarbeiten, sowie Abfuhr PM-Material	27.07.2017	3t	31.07.2017	
10	Erneuerung Rohrdurchlässe	31.07.2017	11t	14.08.2017	
11	Bodenabtrag Böschungen, Durchführung Untergrundverbesserung	31.07.2017	16t	21.08.2017	
12	Herstellung Grabenmulden	31.07.2017	16t	21.08.2017	
13	Herstellung Feinplanum	14.08.2017	6t	21.08.2017	
14	Herstellung monolitische Rinnen	14.08.2017	3t	16.08.2017	
15	Einbau Asphalttragschicht	21.08.2017	2t	22.08.2017	
16	Einbau Asphaltdeckschicht	23.08.2017	1t	23.08.2017	
17	Herstellung Seitenanschlüsse	24.08.2017	3t	28.08.2017	
18	Herstellung Bankette, Beschilderung und Leitpfosten	24.08.2017	2t	25.08.2017	
19	Umbau Verkehrssicherung BA 2 zu BA 3	28.08.2017	1t	28.08.2017	
	BA 3 - Wissinghausen -> Küstelberg 29.08.-06.11.17				
20	Baufeldberäumung Grassmaat, Schutzplanken,	29.08.2017	5t	04.09.2017	
	Leuchtpfosten, Beschilderung, Rodungsarbeiten,				
	Herstellung Baumschutz				
21	Asphaltfräsarbeiten, sowie Abfuhr PM-Material	04.09.2017	6t	11.09.2017	
22	Erneuerung Rohrdurchlässe	08.09.2017	9t	20.09.2017	
23	Abtrag Böschungen, Verlegung Teilsickerrohr	11.09.2017	24t	13.10.2017	
24	Bodenabtrag, Durchführung Untergrundverbesserung	15.09.2017	21t	16.10.2017	
25	Herstellung Feinplanum mit Einbau FS-Ausgleich	09.10.2017	7t	17.10.2017	
26	Verlegung Randbereich RAGI	12.10.2017	4t	17.10.2017	
27	Einbau Asphalttragschicht	17.10.2017	5t	23.10.2017	
28	Einbau Asphaltdeckschicht	24.10.2017	2t	25.10.2017	
29	Herstellung Seitenanschlüsse	26.10.2017	5t	01.11.2017	
30	Herstellung Bankette, Beschilderung und Leitpfosten	30.10.2017	5t	03.11.2017	
31	Baustelle räumen	03.11.2017	2t	06.11.2017
